



SÚHRNNÁ HODNOTIACA SPRÁVA ZA ROK 2023

Plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lozorno na roky 2022-2027

V Lozorne, dňa 31.5.2024


Obecný úrad spracúva a predkladá na ročnej báze Správu o plnení schváleného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lozorno (ďalej len PHSR) za predchádzajúci rok. Správu prerokováva Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí spolu so Záverečným účtom obce a Hodnotiacou správou plnenia rozpočtu obce za predchádzajúci rok, rovnako ako aj odpočet plnenia schváleného Komunitného plánu sociálnych služieb obce za predchádzajúci rok.

Správa o plnení PHSR obce Lozorno za rok 2023 je vypracovaná ako odpočet plnenia jednotlivých schválených úloh a priorít PHSR zaradených do piatich strategických cieľov. Do podrobného prehľadu plnenia sú zahrnuté aj aktivity, ktoré nepredstavujú čerpanie finančných prostriedkov v roku 2023.

Prehľad použitých finančných prostriedkov na aktivity a projekty PHSR v roku 2023:


	Strategický cieľ PHSR obce Lozorno	Celková výška použitých finančných prostriedkov na jednotlivé ciele PHSR v roku 2023
1.	Dopravná infraštruktúra	72 016,45 EUR
2.	Technická infraštruktúra	19 925,22 EUR
3.	Socio-ekonomický rozvoj	0,00 EUR
4.	Životné prostredie	165 145,53 EUR
5.	Občianska vybavenosť	3 771 048,22 EUR
	SPOLU	4 028 135,42 EUR

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE POUŽITÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

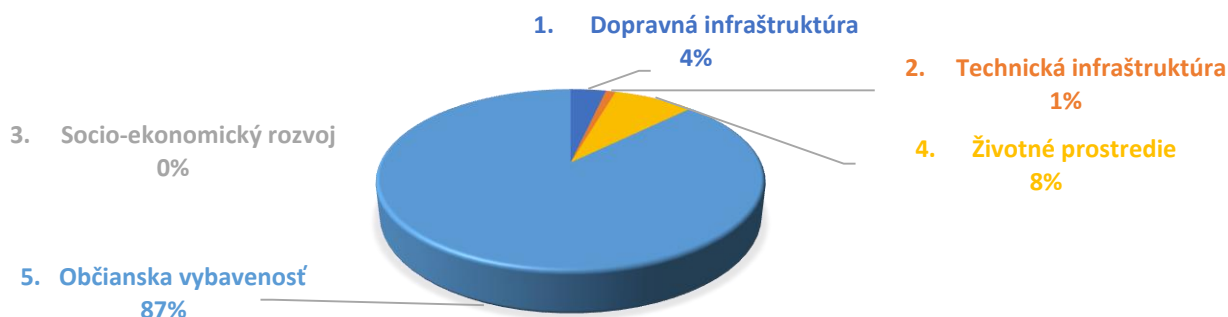

Celkové finančné prostriedky vynaložené na realizáciu projektov odpočítovaných v plnení PHSR za rok 2023 predstavujú sumu **4 028 135,42 EUR**, z čoho **národné zdroje** (skr. NZ) predstavujú sumu **2 034 826,42 EUR** a **Európske zdroje zo štrukturálnych fondov** (skr. EÚ) sumu **1 993 309,00 EUR**.

Celkové finančné prostriedky - podiel

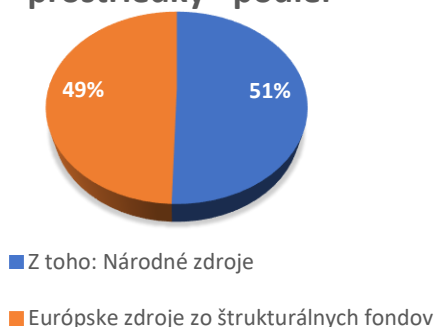

Národné zdroje ďalej v Správe PHSR členíme:

- **na vlastné zdroje obce** (skr. VZO), ktoré predstavujú **99%** podiel z celkových národných zdrojov (kód zdroja 41, 46, 52, 72g);
- iné **národné externé zdroje** (skr. NEZ), ktoré predstavujú **1%** podiel z celkových národných zdrojov (kód zdroja napr. 72a, 11H a pod.).

CIEĽ / Priorita/ Opatrenie	Aktivita	PHSR BSK	Realizácia projektov v r.2023 – Názov, stručný popis projektu (dosiahnuté ciele, situácia po ukončení projektu)	Finančné prostriedky	Program. kapitola rozpočtu/ kód zdroja
D O P R A V N Á I N F R A Š T R U K T Ú R A	Priorita 1.1: Pešie komunikácie / Opatrenie 1.1.1: Pešia doprava				
	Aktivita 1.1.1.1: Vybudovanie náučného chodníka okolo vodnej priehrady	4. Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra 4.2 Zlepšenie podmienok pre rozvoj turizmu v prírode a vidieckeho turizmu	V roku 2023 nebol vybudovaný náučný chodník okolo vodnej priehrady.	Plánované hodnoty: Dĺžka: 3,6 km EÚ: 45 000 € NZ: 5 000 € Skutočnosť: Dĺžka: 0 km EÚ: 0 € / NZ: 0 €	-/-
	Aktivita 1.1.1.2: Vybudovanie autobusových zastávok	P1: Udržateľná mobilita 1.4 Podpora a rozvoj integrovaného dopravného systému	Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok Celák a Karpatská. Revitalizácia autobusových zastávok bola zameraná na ich obnovu, výmenu pôvodného prístrešku za nový, dizajn nástupišťa zastávky a jeho okolia. Súčasťou prístreškov je extenzívna vegetačná vrstva - spolu so sedením. Okolie zastávky je podporené výsadbou trvalých kvitnúcich kríkov, okrasných stromov. Okrem vlastných zdrojov obce bolo krytie KV zabezpečené dotáciou z projektu BSK vo výške 14 229 EUR.	Plánované hodnoty: Počet: 4 ks EÚ: 60 000 € NZ: 60 000 € Skutočnosť: Počet: 2 ks EÚ: 0 € NZ: 48 089,96 € - z toho: VZO: 33 860,96 € NEZ: 14 229,00 €	PK 5.3/ 41/ KV PK 5.3/ 11H/KV
	Aktivita 1.1.1.3: Vybudovanie chodníkov v obci	P1: Udržateľná mobilita 1.3 Podpora nemotorovej dopravy a služieb zdieľanej mobility	Projekt: Realizácia chodníka Hlavná (spolu 58 m) – prepoj zastávky Karpatská k domu č.91 (45 m) a na druhej strane pred domom č.79/1 a 79/8 (13m). Projekt bol realizovaný z výnosov z poplatku za rozvoj vo výške 10 699 EUR. Projekt: Realizácia chodníka z mlatového povrchu v parku na Zvončinskej ulici v dĺžke 82 m v rámci aktivity „Realizácia parku v zmysle PD na Zvončinskej ulici v Lozorne“.	Plánované hodnoty: Dĺžka 2 km EÚ: 0 € NZ: 100 000 € Skutočnosť: Dĺžka 0,138 km EÚ: 0 € NZ: 19 186,49 € - z toho: VZO: 19 186,49 €	PK 5.3/ 72g/ KV PK 5.3/ 41 / KV

			Projekt bol realizovaný z vlastných zdrojov obce vo výške 8 487,49 €.		
Priorita 1.2: Cyklo doprava / Opatrenie 1.2.1: Rozvoj cyklistiky					
	Aktivita 1.2.1.1: Budovanie cyklotrás (prepojenie s inými obcami)	P1: Udržateľná mobilita 1.3 Podpora nemotorovej dopravy a služieb zdieľanej mobility	Projekt: Cyklotrasa do Stupavy a cyklochodník – železničná vlečka-Kamenný mlyn V roku 2023 boli z kapitálových prostriedkov obce realizované: - prípravná a projektová dokumentácia na cyklotrasu do Stupavy vo výške: 3 350,00 € - prípravná a projektová dokumentácia na cyklotrasu do Stupavy vo výške: 1 390,00 €. Plánované investície budú v ďalšom období vzhľadom na možnosti financovania, vysporiadania a povoľovania.	Plánované hodnoty: Dĺžka: 4,5 km EÚ: 2 000 000 € NZ: 900 000 € Skutočnosť: Dĺžka: 0 km EÚ: 0 € NZ: 4 740,00 € - z toho: VZO: 4 740,00 €	PK 9.1/ 41 /KV
Priorita 2.1: Rekonštrukcia technickej infraštruktúry / Opatrenie 2.1.1: Bezpečnosť					
T E C H N I C K Á	Aktivita 2.1.1.1: Vybudovanie kamerového systému	7. Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov 7.1 Modernizácia vybranej technickej infraštruktúry	Projekt: Doplnenie kamerového systému V roku 2023 bola realizovaná inštalácia 6 ks kamier, ktoré doplnili funkčný kamerový systém o: Kamera č. 29 Budova ŠK hlavný vchod Kamera č. 30 Budova ŠK Kvetinárstvo Kamera č. 31 Zadná brána štadiónu Kamera č. 32 Vstupy do budovy ŠK I Kamera č. 33 Predná brána štadiónu Kamera č. 34 Vstupy do budovy ŠK II	Plánované hodnoty: Počet: 15 ks kamier EÚ: 0 € NZ: 30 000 € Skutočnosť: Počet: 6 ks kamier EÚ: 0 € NZ: 0 €	-/-
	Aktivita 2.1.1.2: Vybudovanie IoT siete	7. Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov 7.1 Modernizácia vybranej technickej infraštruktúry	V roku 2023 nebolo realizované budovanie IoT siete.	Plánované hodnoty: Počet: 5 ks senzorov EÚ: 0 € NZ: 20 000 € Skutočnosť: Počet: 0 ks senzorov EÚ: 0 € NZ: 0 €	-/-

I N F R A Š T R U K T Ú R A	Aktivita 2.1.1.3: Budovanie optickej siete	7. Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov 7.1 Modernizácia vybranej technickej infraštruktúry	Projekt: Budovanie optickej siete na Karpatskej ulici (príprava na kamerový systém) v celkovej dĺžke 1 135 m.	Plánované hodnoty: Dĺžka: 3 km optickej siete EÚ: 0 € NZ: 100 000 € Skutočnosť: Dĺžka: 1,135 km optickej siete EÚ: 0 € NZ: 6 909,66 € - z toho: VZO: 6 909,66 €	PK 3.2 / 41/KV
	Aktivita 2.1.1.4: Rekonštrukcia a vybudovanie miestnych komunikácií a mostov	P1: Udržateľná mobilita 1.2 Zabezpečenie plynulosti a odstránenie kolíznych bodov v cestnej doprave	Projekt: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov Obec realizovala v súvislosti s touto investičnou akciou poklopy a jednotné prechodové rošty k nehnuteľnostiam, ktoré si čiastočne spolufinancovali obyvatelia dotknutých ulíc/ulice.	Plánované hodnoty: Dĺžka: 3 km miestnych komunikácií EÚ: 0 € NZ: 300 000 € Skutočnosť: Dĺžka: 0 km miestnych komunikácií EÚ: 0 € NZ: 13 015,56 € - z toho: VZO: 13 015,56 €	PK 5.3/ 41/BV
	Aktivita 2.1.1.5: Uloženie káblového vedenia verejného osvetlenia do zeme	2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie 2.3 Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a udržateľná energetika	Neboli realizované aktivity, výdavky na verejné osvetlenie - Vzdušné vedenie verejného osvetlenia presmerované do zeme.	Plánované hodnoty: Dĺžka: 3 km uloženej siete VO EÚ: 0 € NZ: 100 000 € Skutočnosť: Dĺžka: 0 km uloženej siete VO EÚ: 0 € / NZ: 0 €	-/-

Priorita 3.1: Sociálna pomoc / Opatrenie 3.1.1: Sociálna inklúzia					
S E C O N O M I C K Ý R O Z V O J	Aktivita 3.1.1.1: Vybudovanie zariadenia pre seniorov	6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť 6.1 Dostupné a moderné sociálne služby	V roku 2023 nebolo vybudované zariadenia pre seniorov.	Plánované hodnoty: Počet: Cca 40 klientov EÚ: 2 500 000 € NZ: 1 000 000 € Skutočnosť: Počet: 0 klientov EÚ: 0 € / NZ: 0 €	-/-
	Aktivita 3.1.1.2: Monitorovací zariadenia pre osamelých seniorov	6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť 6.1 Dostupné a moderné sociálne služby	V roku 2023 neboli zakúpené Monitorovacie zariadenia pre osamelých seniorov.	Plánované hodnoty: Počet: 5 ks zariadení EÚ: 0 € NZ: 15 000 € Skutočnosť: Počet: 0 ks zariadení EÚ: 0 € / NZ: 0 €	-/-
	Aktivita 3.1.1.3: Rozšírenie kapacity zdravotného strediska	5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť 5.1 Komplexná zdravotná starostlivosť	Na zdravotnom stredisku na žiadosť Vaše zubné centrum s.r.o. bola realizovaná prestavba vnútorných priestorov – rozšírenie priestorov zubnej ambulancie o detskú zubnú ambulanciu. Predmetom bolo nové dispozičné riešenie – vybúranie priečok, dostavba priečok, nová vodoinštalácia, rozvody ZTI, elektroinštalácia, dodávka a montáž nového plynového kotla a doplnenie nových vykurovacích telies. Rozšírenie ZS bolo zrealizované z prostriedkov zubného centra v sume 36 455, 05 Eur, čo bude postupne v roku 2024 odpočítavané v splátkach z mesačného nájomného.	Plánované hodnoty: Plocha: 240 m2 EÚ: 450 000 € NZ: 50 000 € Skutočnosť: Plocha 62,13 m2 EÚ: 0 € NZ: 0 €	-/-

Priorita 4.1: Ochrana prírody a krajiny / Opatrenie 4.1.1: Ekologické prvky					
Ž I V O T N É P R O S T R E D I E	Aktivita 4.1.1.1: Výsadba stromov	2. Kvalitné a udržateľné životné prostredie 2.2 Adaptačné a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy, udržateľné využívanie lesov a protipovodňová ochrana a podpora biodiverzity	Projekt: Výsadba stromov Plnenie zabezpečuje spoločnosť LOZORNO spol. s.r.o. v závislosti od vegetačných podmienok. V roku 2023 boli zrealizované nové výsadby: kvetinová výsadba letničiek, Športové námestie, ihrisko potočná, parčík pred OcÚ. Kompletná výsadba parčík pri Centre kultúry, výsadba kvetináče pri kostole, celkovo bolo vysadených 1 263 vysadených drevín, sadeníc a kríkov, z toho 6 ks stromov pred kostolom (Nám. Sv. Kataríny) a 3 ks v parku na Zvončinskej.	Plánované hodnoty: Počet 300 ks EÚ: 80 000 € NZ: 20 000 € Skutočnosť: Plocha 10 ks EÚ: 0 € NZ: 1 561,14 € - z toho: VZO: 1 561,14 €	PK 5.3/ 41 / BV
	Aktivita 4.1.1.2: Osadenie fotovoltaiky na ZŠ, ČOV a ŠK	2. Kvalitné a udržateľné životné prostredie 2.3 Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a udržateľná energetika	V roku 2023 bola vypracovaná PD na osadenie fotovoltaiky na obecné budovy – obecný úrad, zdravotné stredisko, centrum kultúry. Osadenie fotovoltaiky je naplánované v roku 2024 na budovách obecného úradu a centre kultúry.	Plánované hodnoty: Počet: 3 ks fotovoltaic. elektrárni EÚ: 80 000 € NZ: 20 000 € Skutočnosť: Počet: 0 ks fotovoltaic. elektrárni EÚ: 0 € NZ: 2 789,99 € - z toho: VZO: 2 789,99 €	PK 5.2/41 / KV
	Aktivita 4.1.1.3: Vybudovanie vodozadržných opatrení	2. Kvalitné a udržateľné životné prostredie 2.2 Adaptačné a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy, udržateľné využívanie lesov a protipovodňová ochrana a podpora biodiverzity	V roku 2023 bola vypracovaná štúdia - Analýza možností zvýšenia úrovne protipovodňovej ochrany v lokalitách k.ú Lozorno, ktorá ponúka návrh a analýzu možností zvýšenia úrovne protipovodňovej ochrany v lokalitách katastrálneho územia Lozorno a je spracovaná ako vyhodnotenie prírodných podmienok a odtokových pomerov vrátane návrhu opatrení na zníženie ich následkov (ulica Vinohradská). Štúdiu vypracovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v sume 4 200 €..	Plánované hodnoty: Počet: 5 ks zádržných vaní, objem: 100 m ³ EÚ: 25 000 € NZ: 5 000 € Skutočnosť: Počet: 0 ks zádržných vaní, objem: 0 m ³ EÚ: 0 €	

			Zároveň bola vypracovaná jednoduchá urbanisticko architektonická štúdia pre celé územie Záhumenice, Lozorno v sume 8 400 €.	NZ: 12 600,00 € - z toho: VZO: 12 600,00 €	PK 1.1/46 / BV PK 1.1/41 / BV
			Vodozadržné opatrenia sú naplánované a budú realizované v nasledujúcom roku.		
	Aktivita 4.1.1.4: Revitalizácia a budovanie parkových plôch v intraviláne obce	2. Kvalitné a udržateľné životné prostredie 2.2 Adaptačné a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy, udržateľné využívanie lesov a protipovodňová ochrana a podpora biodiverzity	Projekt: Údržba verejnej zelene Prebehla priebežná revitalizácia / údržba, oživenie verejnej zelene – kosenie, hrabanie, zber, odvoz zelene, orezávanie kríkov, konárov, stromov, nákup a výsadba drevín a kvetov, polievanie a iné. Plnenie úloh zabezpečuje spoločnosť LOZORNO spol. s.r.o. v závislosti od vegetačných podmienok. V roku 2023 boli zrealizované nové výsadby: kvetinová výsadba letničiek, Športové námestie, ihrisko potočná, parčík pred OcÚ, kompletná výsadba parčík pri Centre kultúry, výsadba kvetináče pri kostole, celkovo bolo vysadených 1 263 vysadených drevín, sadeníc a kríkov. Spolu plocha o výmere 45 000 m2. Projekt: Vytvorenie zelenej plochy – Nám.sv. Kataríny Pri realizácii Nám sv. Kataríny sa zmenila parkovacia plocha na zelenú – výsadba trávnik (43,20 m2).	Plánované hodnoty: Plocha: 1000 m2 EÚ: 0 € NZ: 100 000 € Skutočnosť: Plocha: 45 043,20 m2 EÚ: 0 € NZ: 148 194,40 € - z toho: VZO: 148 194,40 €	PK 5.1/ 41 / BV PK 5.3/ 41 / KV
	Aktivita 4.1.1.5: Revitalizácia vinice	2. Kvalitné a udržateľné životné prostredie 2.2 Adaptačné a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy, udržateľné využívanie lesov a protipovodňová ochrana a podpora biodiverzity	V roku 2023 nebola realizovaná revitalizácia vinice.	Plánované hodnoty: Plocha: 370 000 m2 EÚ: 0 € VZ: 50 000 € Skutočnosť: Plocha: 0 m2 EÚ: 0 € / NZ: 0 €	-/-

Priorita 5.1: Rozvoj občianskej vybavenosti / Opatrenie 5.1.1: Výstavba a rekonštrukcia OV					
O B Č I A N S K A V Y B A V E N O S Ť	Aktivita 5.1.1.1: Rekonštrukcia starej železničnej stanice	7. Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov 7.2 Obnova špecifickej občianskej vybavenosti a revitalizácia verejných priestorov	V roku 2023 neboli realizované aktivity a výdavky na rekonštrukciu starej železničnej stanice.	Plánované hodnoty: Plocha: 120 m ² EÚ: 200 000 € NZ: 76 000 € Skutočnosť: Plocha: 0 m ² EÚ: 0 € / NZ: 0 €	-/-
	Aktivita 5.1.1.2: Rekonštrukcia kultúrneho domu	7. Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov 7.2 Obnova špecifickej občianskej vybavenosti a revitalizácia verejných priestorov	Projekt: Modernizácia Centra kultúry (CK) Výdavky predstavujú modernizáciu zabezpečovacieho systému budovy Centra kultúry (vo výške 2 236,76 EUR), výmenu kotla a príslušenstva (vo výške 16 105,76 EUR). Projekt: Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu na Športovom námestí v Lozorne Kapitálové výdavky predstavujú výdavky spojené s rekonštrukciou KD, ktoré sú predmetom splátok v ročnej výške 52 237 EUR, výdavky na realizáciu projektu technického vybavenia Kultúrneho domu - svetelná a zvuková aparatura a germicídne žiariče vo výške 61 822 EUR (*NFP z MK SR bude prijatá v roku 2024 vo výške 57 509,39 EUR ako refundácia) a obstaranie nového zabezpečenia budovy KD (elektronický čip).	Plánované hodnoty: Plocha: 1 000 m ² EÚ: 450 000 € NZ: 50 000 € Skutočnosť: Plocha: 468 m ² EÚ: 0 €* NZ: 133 732,38 € - z toho: VZO: 133 732,38 € 7 000,00 KV 11 342,36 KV 87 940,62 KV 1 330,80 KV 26 118,60 KV	PK 6.2/ 41 PK 6.2/ 46 PK 9.1/ 41 PK 9.1/ 46 PK 9.1/ 52
	Aktivita 5.1.1.3: Rozšírenie ZŠ	3. Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie 3.1 Kvalitné vzdelávanie pre inteligentnú špecializáciu v zmysle konceptu SMART školy	Projekt: Rozšírenie – modernizácia základnej školy v Lozorne Výdavky predstavujú výdavky súvisiace s projektom Rozšírenia – modernizácie ZŠ v Lozorne, ktoré sú kryté z prostriedkov NFP so spolufinancovaním z vlastných zdrojov. Plánované rozšírenie kapacity ZŠ o nové triedy nebolo v roku 2023 naplnené, z dôvodu časového posunu realizácie rekonštrukcie ZŠ. Rozšírenie ZŠ a navýšenie kapacít sa	Plánované hodnoty: Plocha: 1000 m ² EÚ: 2 280 000 € NZ: 120 000 € Skutočnosť: Plocha: 2 022,47 m ² EÚ: 1 993 309,00 € NZ: 1 555 391,00 €	

		očekáva až v šk. roku 2024/2025. Výdavky predstavovali celkovú sumu 3 548 700 EUR, z čoho 1 993 309 EUR predstavovali prostriedky z NFP. Skladá sa z 3 častí: Vodná stavba (splašková, dažďová a tuková kanalizácia, však dažďovej vody a požiarna nádrž), Spevnené plochy a komunikácie (parkovacie plochy a prístupová komunikácia) a Stavba ZŠ (rekonštrukcia časti pôvodnej školy a nová prístavba školy – drevostavba vrátane zelenej strechy) s vnútorným priestorovým členením: kuchyňa, jedáleň, spojovací objekt 1. a 2. stupňa, nové triedy a kabinety, sociálne zariadenia, átrium, knižnica a spoločenská časť. Súčasťou je aj bezbariérové WC a bezbariérový vstup do ZŠ. Plánované dokončenie rekonštrukcie je v apríli 2024.	- z toho: VZO: 1 555 391,00 € 1 129 713,39 KV 400 000,00 KV 4 943,85 KV	PK 7.2/ 41 PK 7.2/ 46 PK 7.2/ 52
Aktivita 5.1.1.4: Rozšírenie MŠ	3. Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie 3.1 Kvalitné vzdelávanie pre inteligentnú špecializáciu v zmysle konceptu SMART školy	Projekt: Rozšírenie MŠ V rámci plánovaného rozšírenia MŠ predstavovali v roku 2023 iba výdavky do prípravných prác – inžiniering, povoľovania a prípravy a obstarávania pre stavbu rozšírenia súčasnej kapacity MŠ s cieľom jej realizácie v nasledujúcich obdobiach.	<u>Plánované hodnoty:</u> Plocha: 750 m ² EÚ: 541 500 € NZ: 28 500 € <u>Skutočnosť:</u> Plocha: 0 m ² EÚ: 0 € NZ: 20 734,00 € - z toho: VZO: 20 734,00 € 734,00 KV 20 000,00 KV	PK 7.1/ 41 PK 7.1/ 72g
Aktivita 5.1.1.5: Rekonštrukcia domu smútku	7. Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov 7.2 Obnova špecifickej občianskej vybavenosti a revitalizácia verejných priestorov	Projekt: Rekonštrukcia Smútočnej siene v Lozorne Financovanie nákladov na prvú etapu realizácie projektu zásadnej rekonštrukcie a modernizácie Domu smútku vrátane rozšírenia kapacity obradnej siene. Z celkových rozpočtovaných kapitálových výdavkov je 22 500 EUR dedikovaných z investičného úveru z roku 2020, suma 18 200 EUR predstavuje nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu a ostatné vlastné zdroje predstavujú čiastku 450 000 EUR. V roku 2023 začali po verejnom prerokovaní projektového zámeru stavebno-realizačné práce plánovanej	<u>Plánované hodnoty:</u> Plocha: 300 m ² EÚ: 380 000 € NZ: 20 000 € <u>Skutočnosť:</u> Plocha: 297,96 m ² EÚ: 0 € NZ: 67 881,84 € - z toho: VZO: 67 881,84 €	

			modernizácie Domu smútku (zemné práce a realizácia základových konštrukcií projektu Domu smútku). Zároveň bola aktualizovaná PD na vytvorenie 18 nových urnových miest. Dokončenie modernizácie Domu smútku je naplánované v roku 2024. Kapitálové výdavky predstavovali čerpanie výdavkov na modernizáciu Domu smútku, ktoré začalo až v 2. polroku 2023.	4 500,00 KV 18 200,00 KV 45 181,84 KV	PK 2.4 / 41 PK 2.4 / 46 PK 2.4 / 52
	Aktivita 5.1.1.6: Vybudovanie športovej haly	3. Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie 3.3 Šport , mládež a záujmová činnosť	V roku 2023 neboli realizované aktivity a výdavky na vybudovanie športovej haly.	Plánované hodnoty: Plocha: 1 400 m2 EÚ: 1 800 000 € NZ: 200 000 € Skutočnosť: Plocha: 0 m2 EÚ: 0 € / NZ: 0 €	-/-

Spracovali:

Mgr. Adriana Očenášová, referát projektový a strategický

Mgr. Ľudmila Pastorová, prednostka OcÚ
